


RAPORT O REALIZACJI PROGRAMU
ROZWOJU SUBREGIONU ZACHODNIEGO
REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013



styczeń 2011



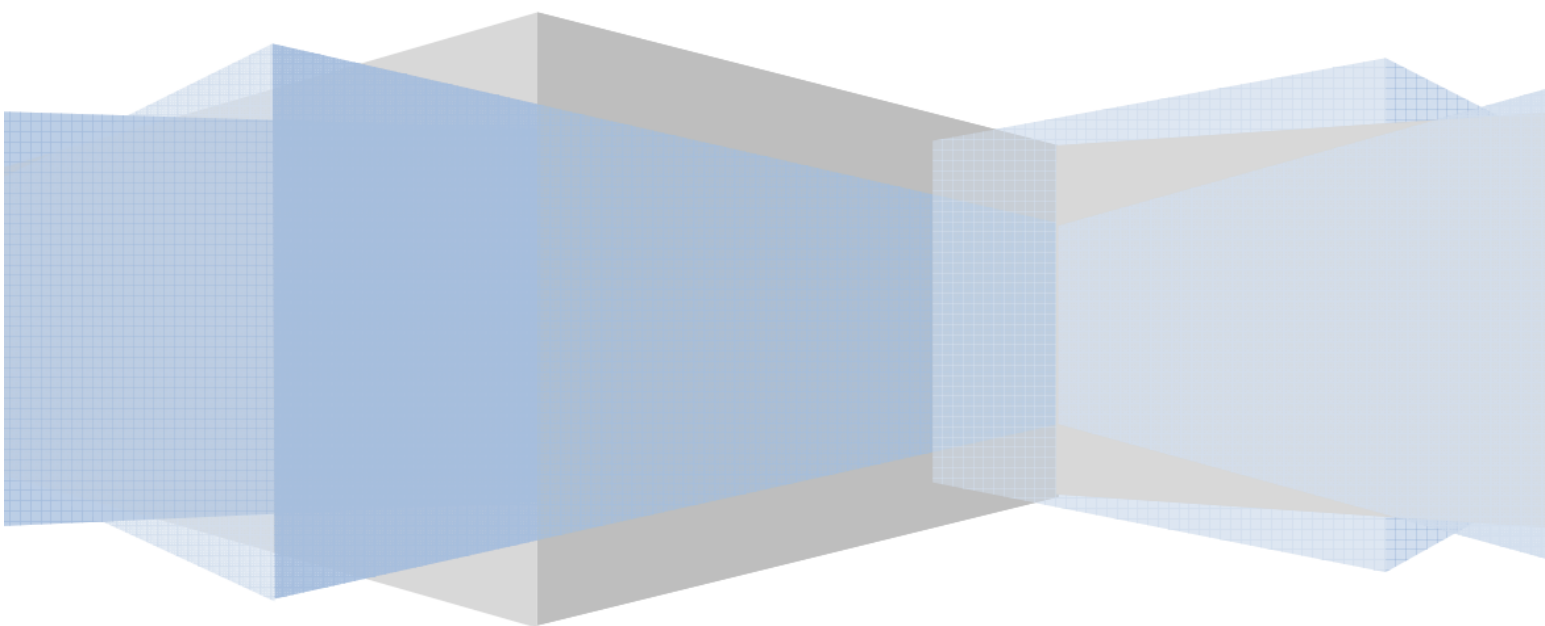

**ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
44-200 RYBNIK, UL. J. I F. BIAŁYCH 7
TEL./FAX 32 42 22 446
BIURO@SUBREGION.PL, WWW.SUBREGION.PL**

RAPORT O REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU ZACHODNIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

RYBNIK 2011

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	4
1.1. Cel.....	5
1.2. Zakres.....	5
2. Zmiany w PRSZ podczas realizacji	6
3. Wnioski o dofinansowanie	6
4. Umowy o dofinansowanie.....	8
5. Zamówienia publiczne.....	9
6. Harmonogram realizacji projektów	9
7. Wnioski o płatność	10
8. Problemy w trakcie realizacji projektów	11
9. Podsumowanie	12

1. Wstęp

Niniejszy raport został wykonany zgodnie z poleceniem Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego siedzibą w Rybniku. Podstawą merytoryczną raportu są ankiety monitoringu realizacji PRSZ przesłane dnia 7 grudnia 2010 r. (l.dz. 382/2010) do Beneficjentów Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (PRSZ), którymi są następujące jednostki samorządu terytorialnego:

- Miasto Rybnik
- Miasto Jastrzębie Zdrój
- Miasto Żory
- Miasto Racibórz
- Miasto Wodzisław Śląski
- Powiat Rybnicki
- Powiat Wodzisławski
- Powiat Raciborski
- Gmina Krzanowice
- Gmina Kuźnia Raciborska
- Gmina Kornowac
- Gmina Rydułtowy
- Gmina Pietrowice Wielkie
- Gmina Pszów
- Gmina Czerwionka – Leszczyny
- Gmina Godów
- Gmina Lubomia
- Gmina Gorzyce
- Gmina Radlin

Autorem raportu jest Lider PRSZ, czyli Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, który jednocześnie jest odpowiedzialny za treść raportu. Wszelkie uwagi proszę kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@subregion.pl.

1.1. Cel

Celem raportu jest przedstawienie możliwie najszerszemu audytorium postępu prac nad Programem Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w sposób przejrzysty i łatwy do zrozumienia przez wszystkich, bez względu na poziom wykształcenia lub wiedzy o funduszach europejskich. Uważamy, że informowanie mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, których w szczególności dotyczą projekty realizowane w ramach PRSZ, jest sprawą kluczową dla dobrych relacji pomiędzy władzą lokalną, a obywatelami. Realizacja i publikacja raportu nie wynika z żadnych wytycznych krajowych lub wspólnotowych, a jedynie chęci informowania obywateli o postępach prac oraz zachęcanie do większego zainteresowania życiem publicznym w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. Raport za czwarty kwartał 2010 roku jest pierwszym w kolejności z raportów które będą publikowane kwartalnie.

1.2. Zakres

Zakres ankiet monitoringu okresowego, które są głównym źródłem informacji wykorzystanych w niniejszym opracowaniu i samego raportu obejmuje podstawowe informacje dotyczące projektów PRSZ czyli:

- wnioski aplikacyjne projektów,
- podpisane umowy o dofinansowanie projektów,
- realizację projektów zarówno finansową jak i rzeczową,
- ewentualne problemy, z którymi Beneficjenci PRSZ musieli się zmierzyć podczas realizacji projektów.

Powyższy zakres jest podyktowany chęcią przedstawienia najważniejszych danych dotyczących Programu bez wchodzenia w poziom szczegółowości, który mógłby rozmyć najważniejsze informacje dotyczące realizacji PRSZ. Jeśli czytelnik uważa, że

poziom szczegółowości raportu jest dla grupy docelowej określonej powyżej, mało dokładny, prosimy o informacje, na podstawie których zostanie dokonana korekta poziomu szczegółowości w raporcie za pierwszy kwartał 2011 r. Każdy raport, zarówno niniejszy jak i kolejne będą objęte perspektywą czasową od początku realizacji PRSZ, aż do dnia tworzenia danego raportu. W przypadku kolejnych publikacji, będą przedstawione dane porównawcze do poprzednich okresów, które z oczywistych względów nie są zawarte w niniejszym raporcie.

2. Zmiany w PRSZ podczas realizacji


Realizacja Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego dotychczas przebiegała prawie bez większych zmian względem dokumentu pierwotnego. Jedyną wartą podkreślenia zmianą było dofinansowanie trzech dodatkowych projektów drogowych w ramach Poddziałania 7.1.2 dzięki wygenerowaniu oszczędności przetargowych w niniejszym Poddziałaniu przez Powiat Wodzisławski. Decyzją Reprezentacji Subregionu (Zarządu Związku Subregionu Zachodniego) zostały dofinansowane następujące trzy projekty:

1. Modernizacja drogi gminnej – ulicy Wolności w Syryni – Gmina Lubomia,
2. Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem – Gmina Gorzyce,
3. Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 – Gmina Radlin.

3. Wnioski o dofinansowanie


Na liście podstawowej projektów PRSZ znajduje się w chwili obecnej 40 projektów podzielonych na 12 Działań/Poddziałań w ramach 6 priorytetów. Do momentu sporządzania raportu zostały złożone wnioski aplikacyjne prawie do wszystkich projektów z czego 4 znajdują się w trakcie procedury oceny formalnej lub merytorycznej. Jeden projekt w Poddziałaniu 7.1.2 zostanie złożony w roku 2011.

W trakcie oceny są projekty działania 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

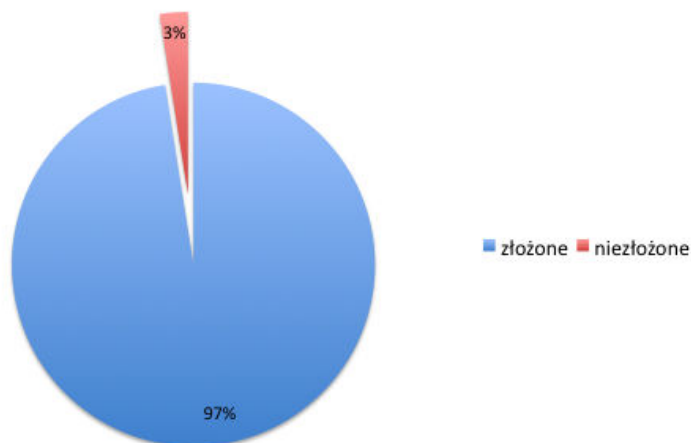

Wykres 1. Złożone wnioski aplikacyjne (stan na grudzień 2010 r.)


Poniższy wykres przedstawia linię czasu składania wniosków o dofinansowanie (niebieski), zakończenia oceny merytorycznej (czerwony) oraz podpisania umowy o dofinansowanie (zielony).

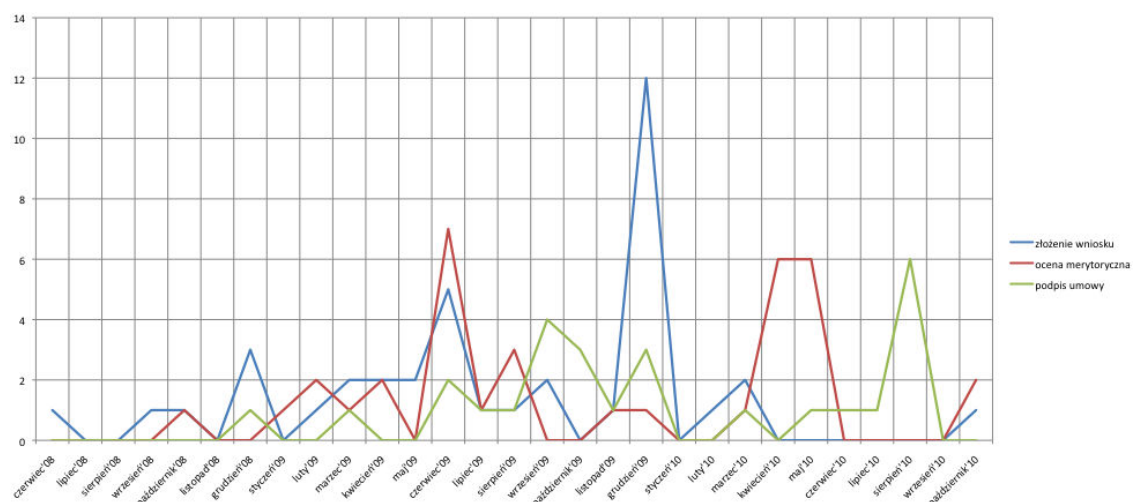

Wykres 2. Przedstawienie okresu aplikacji, oceny merytorycznej oraz podpisania umowy (stan na grudzień 2010 r.)

4. Umowy o dofinansowanie


Spośród 40 złożonych wniosków o dofinansowanie dotychczas zostały podpisane umowy o dofinansowanie 32 projektów.

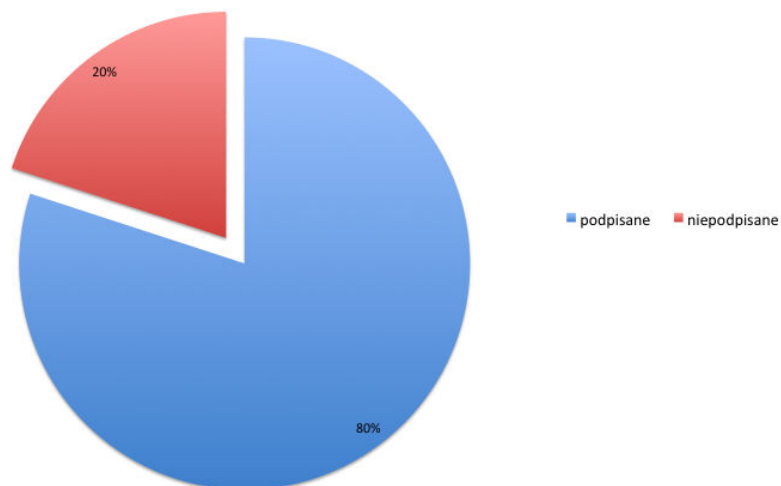

Wykres 3. Podpisane umowy o dofinansowanie (stan na grudzień 2010 r.)

Projekty w których do chwili sporządzenia raportu nie podpisano umów o dofinansowanie znajdują się w następujących działaniach :

1. Działanie 2.1 – 3 projekty,
2. Działanie 2.2 – 1 projekt,
3. Poddziałanie 3.2.2 – 1 projekty,
4. Poddziałanie 7.1.2 – 3 projekty.

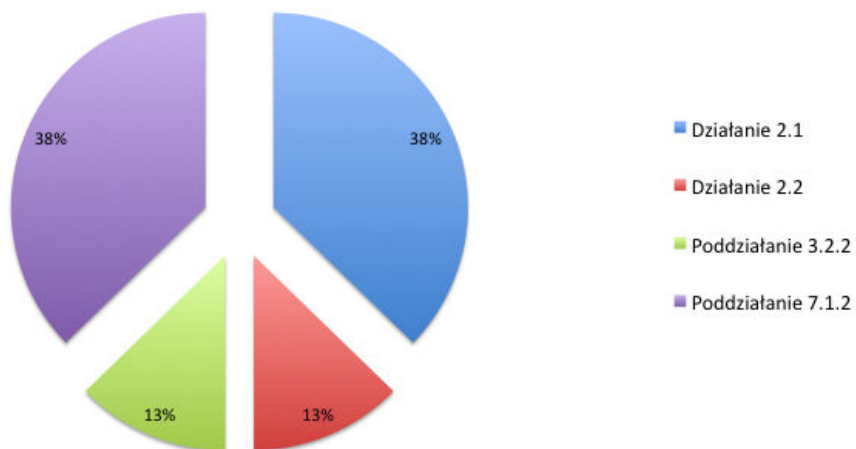


Wykres 4. Niepodpisane umowy o dofinansowanie (stan na grudzień 2010 r.)

Podpisanie umów o dofinansowanie tych projektów w wymienionych działaniach prognozowane jest na pierwszy kwartał 2011 r.

5. Zamówienia publiczne

W PRSZ w ramach wszystkich projektów zostało zaplanowane 126 postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W chwili obecnej 97 zostało zrealizowanych, 3 znajdują się w trakcie rozstrzygnięcia, a 26 czeka na ogłoszenie. Przewiduje się ogłoszenie pozostałych postępowań w roku 2011.

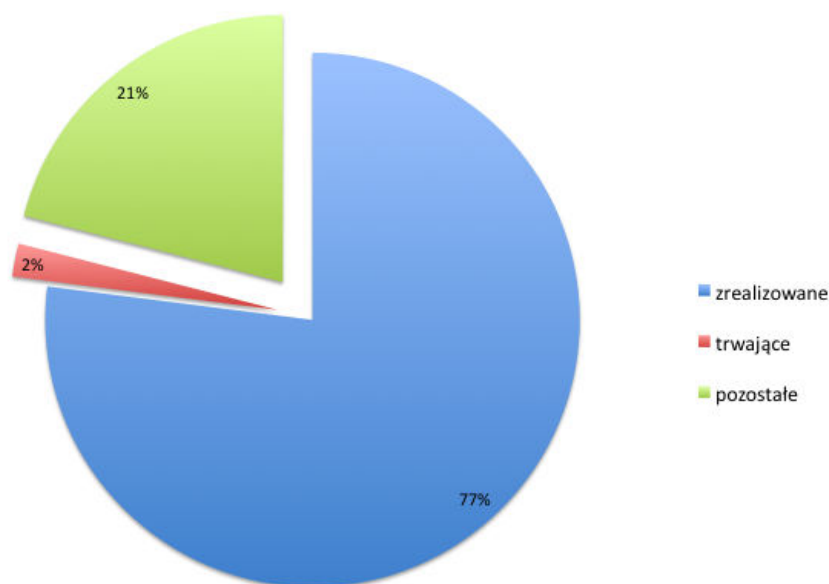

Wykres 5. Zamówienia publiczne (stan na grudzień 2010 r.)

6. Harmonogram realizacji projektów

Zmiany w harmonogramie realizacji projektów wystąpiły w 24 przypadkach. Głównie były spowodowane:


- zwiększeniem wartości całkowitej projektu,
- zmianami okresu realizacji,

- przesunięciami kwot między zadaniami,
- zmianami wartości kosztów kwalifikowanych,
- zwiększeniem wartości poszczególnych zadań,
- zmianą kosztów całkowitych projektu po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zmiany harmonogramu realizacji projektów nie zagrażają zakończeniu ich realizacji w terminie określonym przez wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, w związku z powyższym nie przewiduje się zmniejszenia liczby realizowanych w ramach PRSZ projektów.


7. Wnioski o płatność

Do grudnia 2010 roku łączna kwota złożonych do IZ RPO WSL wniosków o płatność wynosi 59 231 715,38 zł (54 wnioski). Dotychczas zostały zatwierdzone 42 wnioski o płatność, a kolejne 12 znajduje się w trakcie weryfikacji.

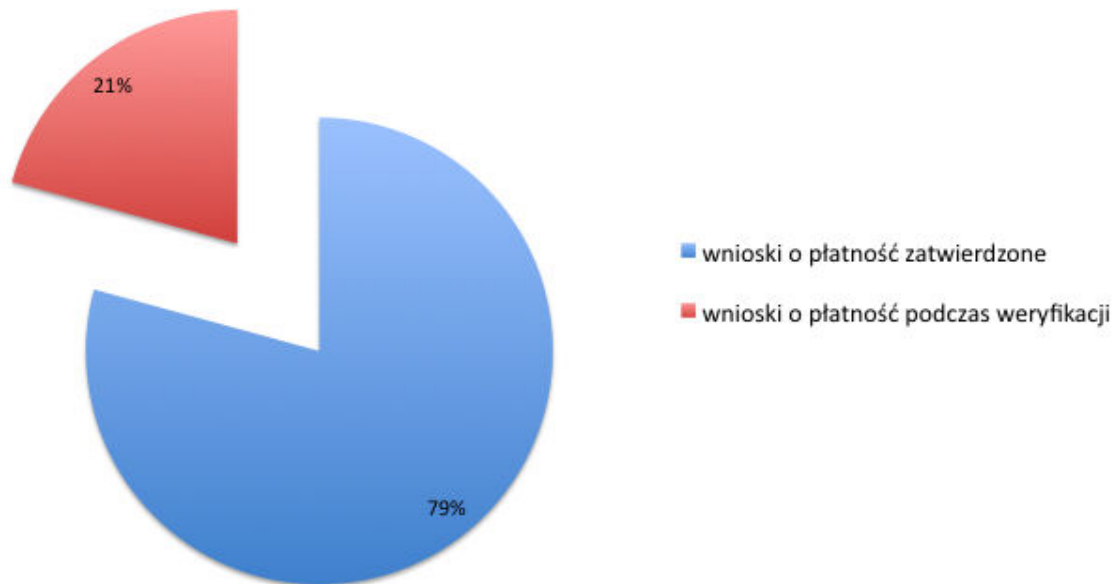

Wykres 6. Złożone wnioski o płatność (stan na grudzień 2010 r.)

W podziale na działania ilość złożonych wniosków o płatność uклада się następująco:

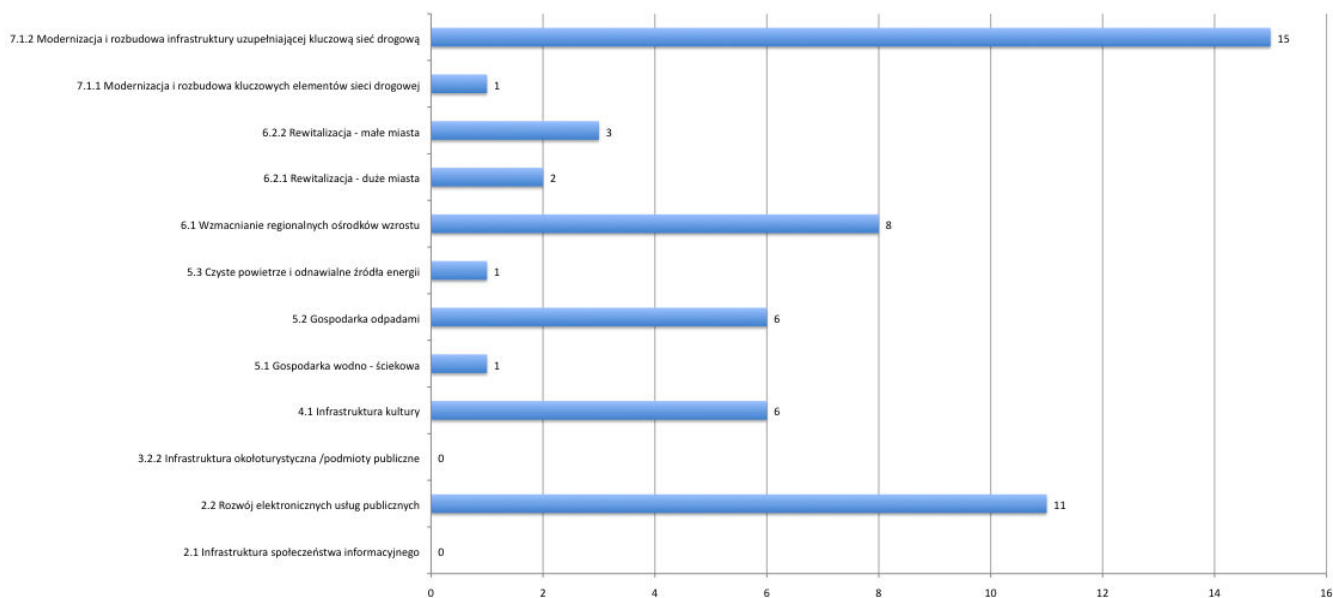

Wykres 7. Wnioski o płatność w poszczególnych działaniach (stan na grudzień 2010 r.)

8. Problemy w trakcie realizacji projektów

Z ankiet przesłanych przez Beneficjentów wynika, że ogromna większość projektów jest realizowana bez zakłóceń i przeszkód. Przypadki gdzie pojawiały się problemy były sporadyczne. Spośród problemów wymienianych przy realizacji projektu Beneficjenci najczęściej wymieniali:

- trudności w rozstrzygnięciu procedury zamówień publicznych (np. z powodu braku ofert),
- niekorzystne warunki atmosferyczne podczas realizacji zadania,
- konieczność modyfikacji wniosków z uwagi na zagrożenie pomocą publiczną,
- brak rzetelności wykonawców robót,
- konieczność wykonania nie dających się przewidzieć na etapie tworzenia projektu prac dodatkowych.

W chwili obecnej również nie jest możliwe określenie samorządu opóźniającego wdrażanie PRSZ, ani lidera wśród Beneficjentów, każdego z nich można ocenić bardzo dobrze.

9. Podsumowanie

Zgodnie z dostępnymi danymi można stwierdzić, że realizacja PRSZ przebiega bez większych zakłóceń i przeszkód. Niemalże wszystkie projekty zostały złożone, żaden nie został oceniony negatywnie, co na przykład miało miejsce w innych subregionach. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów i późniejsza ich realizacja przebiega zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Realizowane projekty PRSZ przyczyniają się do osiągnięcia zarówno celu głównego opisanego w dokumencie Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, którym jest stymulowanie dynamicznego rozwoju subregionu zachodniego, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, jak i następujących celów szczegółowych:

- poprawa warunków skomunikowania Subregionu Zachodniego,
- stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
- rozwój miast poprzez wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu oraz rewitalizację obszarów zdegradowanych,
- rozwój infrastruktury okołoturystycznej,
- rozwój infrastruktury kulturowej,
- poprawa jakości środowiska.

Ze strony organizacyjnej Subregion Zachodni został doceniony przez IZ RPO WSL jako najlepiej zorganizowany lider PRS, o czym świadczy raport firmy PSDB Sp. z o.o. z Warszawy dotyczący badania: „Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2007-2013: Indykatory Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów” przeprowadzanego w okresie od stycznia do lipca 2010 r. dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Głównymi celami badania były ocena zasadności zastosowania pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów oraz analiza elementów, które należy poprawić w przyszłym okresie programowania w ramach mechanizmów pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów.

Niemalym sukcesem jest fakt, iż rekomendacje raportu PSDB Sp. z o.o. o dotyczyły wprowadzenia procedur i schematu organizacyjnego wdrażania i monitorowania PRS przez Lidera Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego we wszystkich subregionach województwa śląskiego. Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

